

事業スケジュールの変更

東京都より事業計画の変更が認可され、平成31年1月7日に告示がありましたのでお知らせいたします。


《事業計画の変更内容:事業施行期間》

(当初)平成23年12月20日～2021年3月31日〔平成33年3月31日〕

(変更)平成23年12月20日～2024年3月31日〔平成36年3月31日〕

年度	2011～2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	平成23～27	平成28	平成29	平成30	平成31				
当初工程		2016.6 下り急行線高架化			2019.3 上り急行線高架化		37・38号踏切解消 (引上線高架含む)		
			高架橋工事・仮線工事等		高架橋工事・側道復旧等		2021.3 上下緩行線高架化		
変更工程		2016.5 下り急行線高架化				2020.9 上り急行線高架化		37・38号踏切解消	
			高架橋工事・仮線工事等			高架橋工事		2022.3 上下緩行線高架化 高架引上線・高架下整備 仮設地下駅撤去・側道復旧	

なお、踏切解消は平成30年1月に、皆様へお知らせさせていただいた2022年3月を予定しております。

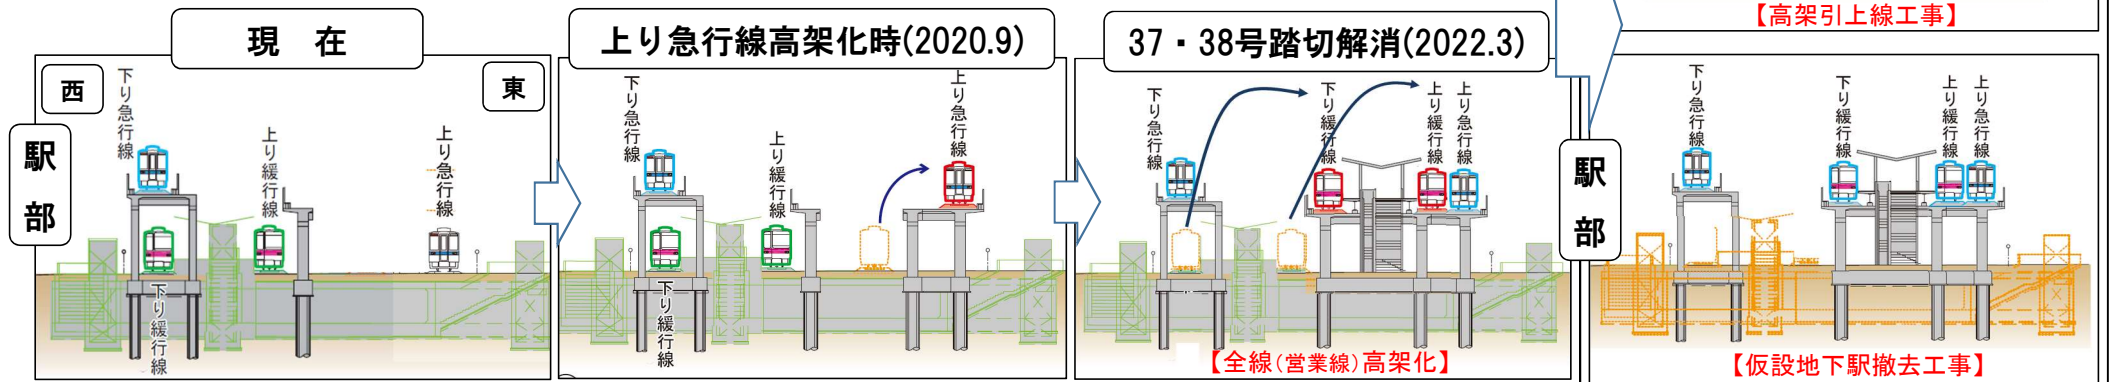

皆様方には引き続き、当事業にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

足立区鉄道立体推進室(Tel03-3880-5484)

(Fax03-3880-5615)
