② 五丁田公園（測定値）

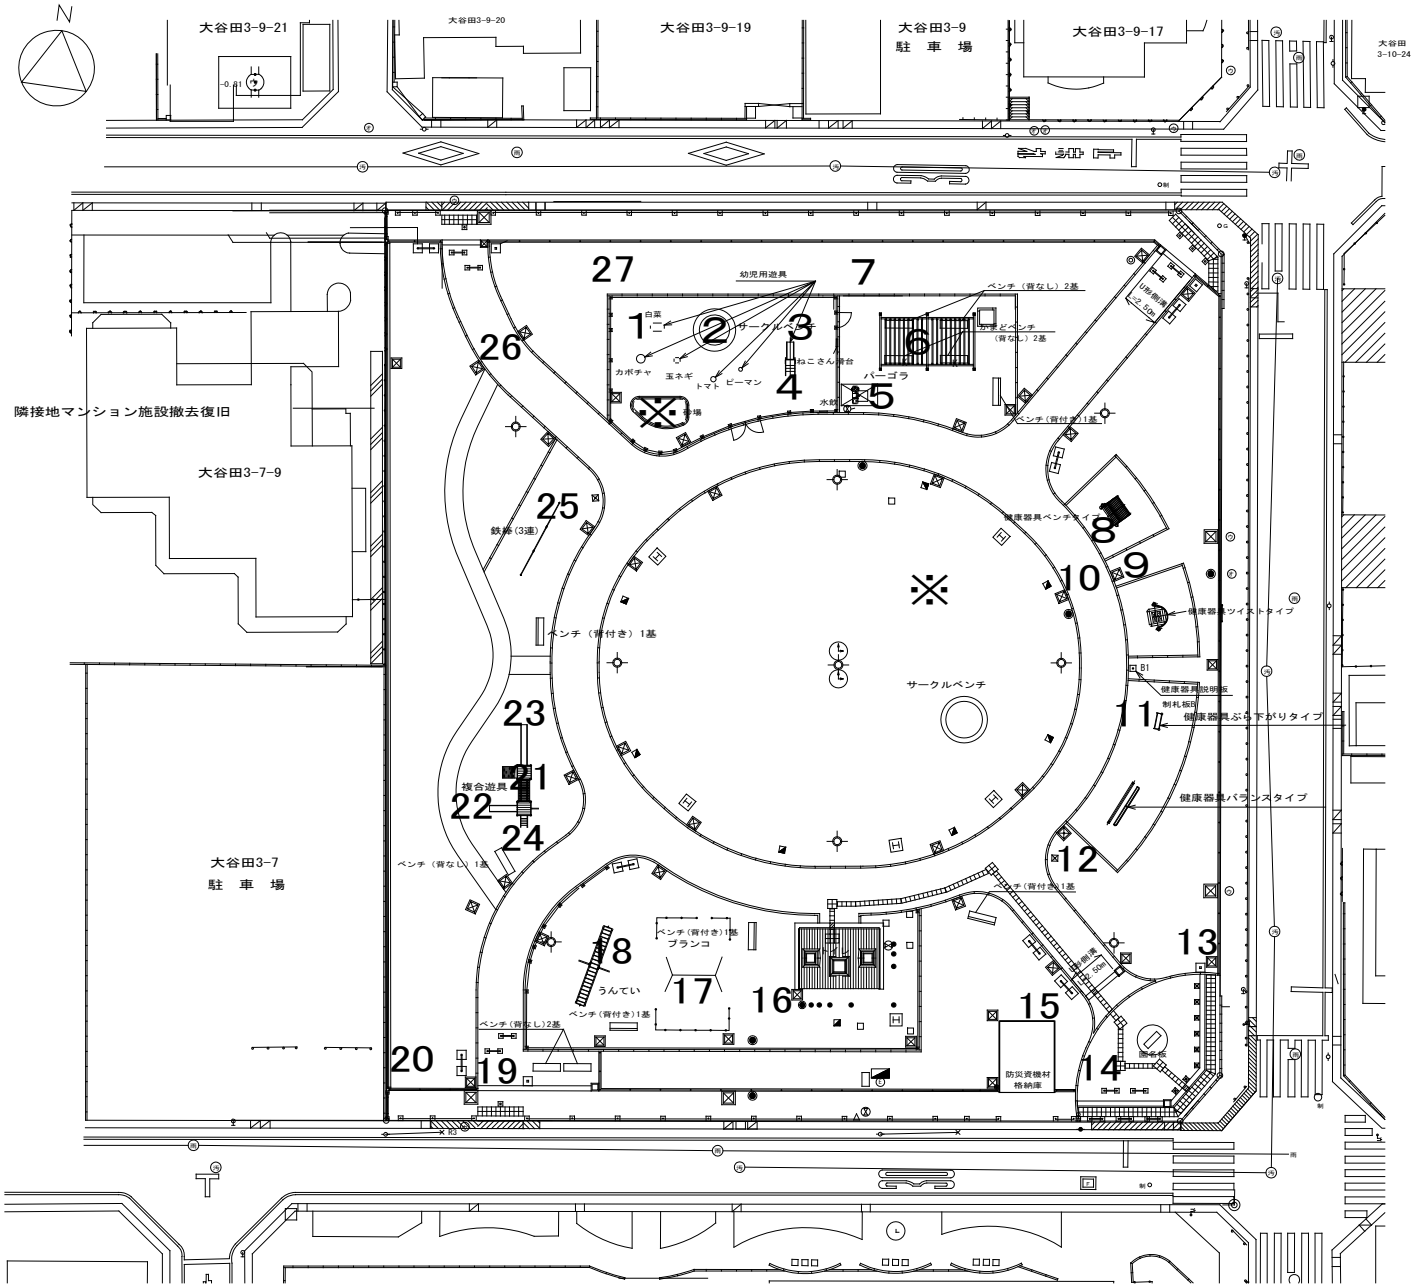

No.	測定施設	測定箇所	測定数値（μSv/h）		
			1m	50cm	5cm
	幼児遊具広場				
1	置物遊具	白菜	0.20	0.20	0.20
2	サークルベンチ	落葉樹	0.18	0.18	0.19
3	ねこの滑り台	滑り面下部	0.17	0.19	0.17
4		階段下	0.18	0.21	0.22
	公園北側				
5	水飲み場	排水桝上	0.15	0.17	0.16
6	藤棚		0.14	0.14	0.13
7	植込み地		0.22	0.24	0.26
	公園東側				
8	背伸ばしベンチ		0.18	0.18	0.17
9	集水桝		0.20	0.22	0.20
10	集水桝		0.19	0.21	0.20
11	ぶらさがり		0.19	0.20	0.18
	公園南東側				
12	植込地（落葉樹）	根元	0.24	0.27	0.25
13	集水桝		0.21	0.22	0.25
14	出入口		0.18	0.19	0.23
15	防災資機材倉庫	雨水桝上	0.18	0.20	0.25
	公園南西側				
16	トイレ脇集水桝		0.17	0.18	0.16
17	ブランコ	吊席下	0.14	0.14	0.13
18	雲梯		0.15	0.16	0.14
19	集水桝		0.19	0.19	0.17
20	植込み地		0.19	0.20	0.22
21	複合遊具	デッキ下	0.18	0.17	0.18
22		小滑り台滑り面下部	0.18	0.21	0.31
23		大滑り台滑り面下部	0.21	0.24	0.31
24		階段下	0.22	0.25	0.30
	公園北西側				
25	鉄棒		0.15	0.15	0.13
26	園路		0.21	0.24	0.25
27	植込み地		0.20	0.22	0.25
参考値（2011年7月～8月の測定対象地）					
※	空間線量		0.12	0.13	0.13
※	砂場		0.18	0.17	0.18

2011年11月 2日測定

② 五丁田公園（低減対策後測定値）

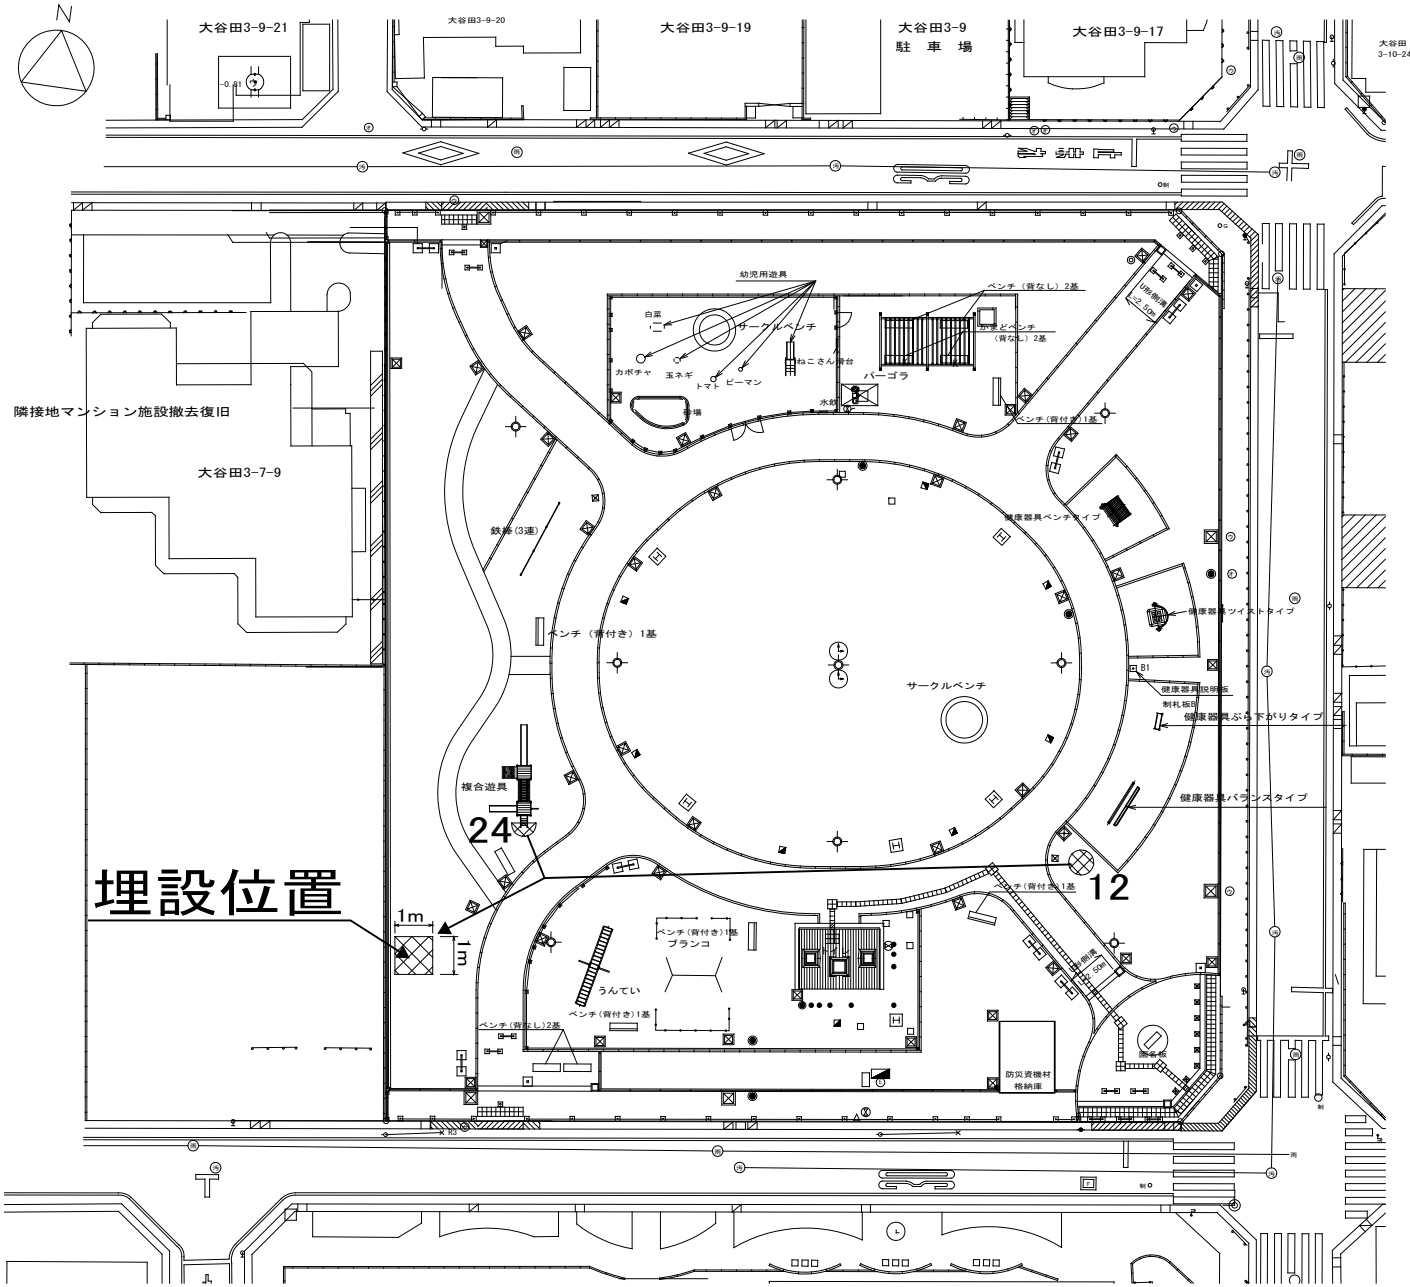

測定の結果、高さ50cmの地点で区の指標値である0.25μSv/h以上の地点については、低減対策を実施したところ、指標値を下回りました。

No.12 対応箇所:植込地
対応方法:地表2～3cmの土の入換え

No.24 対応箇所:複合遊具
対応方法:チップ舗装除去

低減対策後

No.	測定施設	測定箇所	測定数値(μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
12	植込地(落葉樹)	根元	0.22	0.22	0.17
24	複合遊具	階段下	0.20	0.23	0.25

2011年11月 2日測定
