

第2回 花畑川を考える会

令和4年11月29日
佐野地域学習センター

(1) 第1回議事概要と資料について

(1) 第1回議事概要と資料について

「資料(2) 第1回花畑川を考える会 議事概要」
をご参照ください。

第2回 花畑川を考える会


令和4年11月29日
佐野地域学習センター

本日の議題

- 1 工事内容の大幅変更について
- 2 その1工事の進捗について
- 3 その1工事のスケジュールについて
- 4 関連団体のヒアリングについて
- 5 今後の「考える会」の進め方について

1 工事内容の大幅変更について

1 「その1」工事内容の大幅変更について

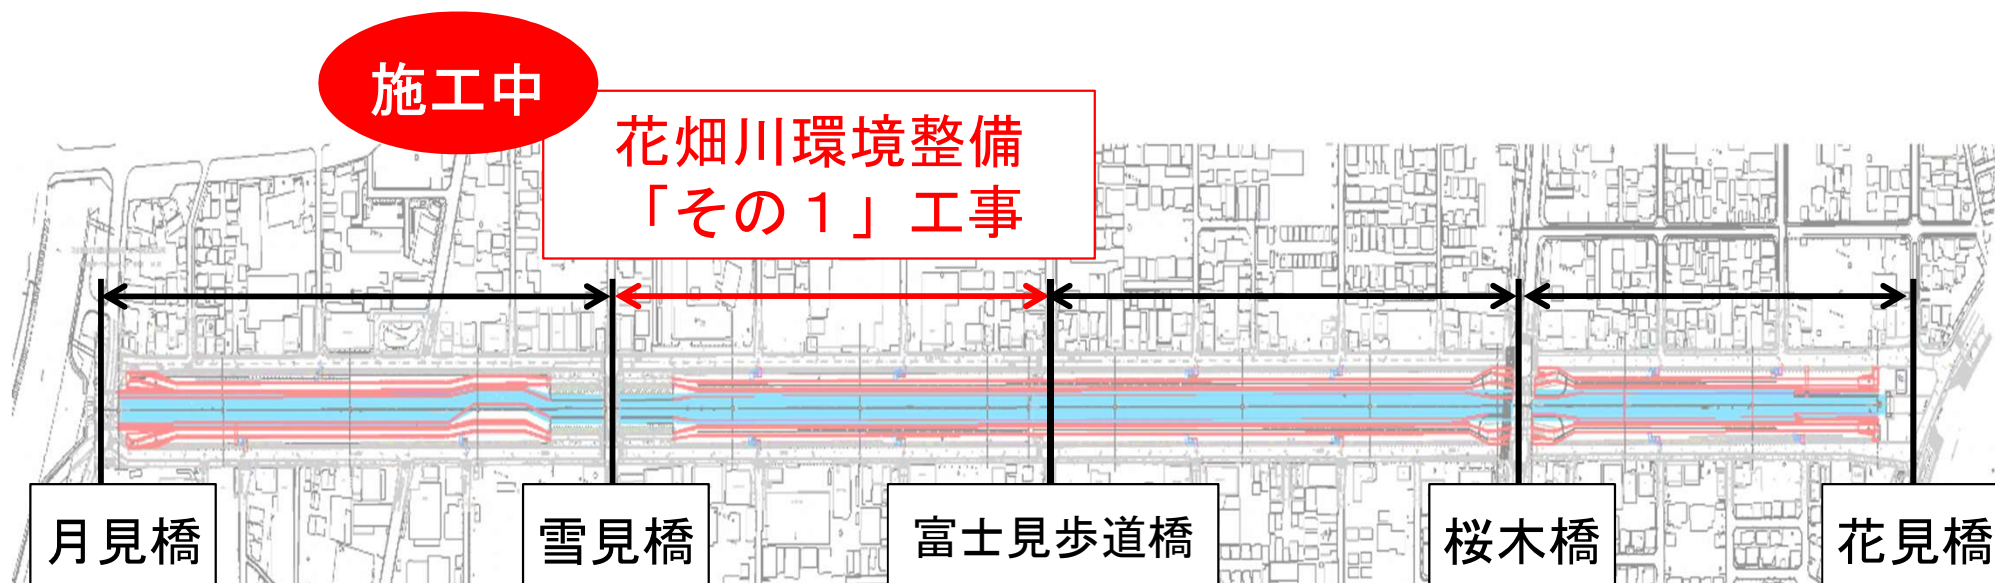

「その1」工事は当初の予定になかった、川底に堆積した約1mの泥土の対応が必要となった。

- 約1年の工事期間の延長を行った。
- 大幅な工事費用の増額を行った。

1 - 1 約1年工事期間の延長

これまでの工事期間 令和3年3月24日～令和5年11月20日

見直した工事期間 令和3年3月24日～令和6年10月31日

- ・ 泥土を発見した結果、**軟弱地盤対策**を行った。

 **・ 約1年間の工事期間の延長**を行った。



- 施工区間全域にわたって
泥土が堆積していた。



軟弱地盤対策（泥土処理）

- **泥土**の**お**いの**軽減**
- **川底**の**地盤**を**強化**



- ・当初の予定していた土のうの数では水を締めきれなかった。



仮締切の増加（漏水対策）を行った。

1 - 4 工期延伸に伴う賃料、誘導員等の増加 約0.5億円



- ・ 軟弱地盤対策のため、約1年間の工事期間の延伸を行った。



敷鉄板の賃料や誘導員等の増加を行った

1 - 5 工事予算の増額のまとめ


| 変更回 | 時期 | 契約金額 | 変更額 |
|-----|-------|--------------|---------------------------|
| 当初 | 令3.3 | 501,050,000円 | — |
| 1回目 | 令3.7 | 505,582,000円 | 4,532,000円 |
| 2回目 | 令3.10 | 621,277,800円 | 115,695,800円 |
| 3回目 | 令4.10 | 994,084,300円 | 372,806,500円 |
| | | 計 | 493,034,300円 (増加98.4%) |




当初の工事予算から**約5億円の増額**を行いました。

2 その1工事の進捗について

2 その1工事の進捗について

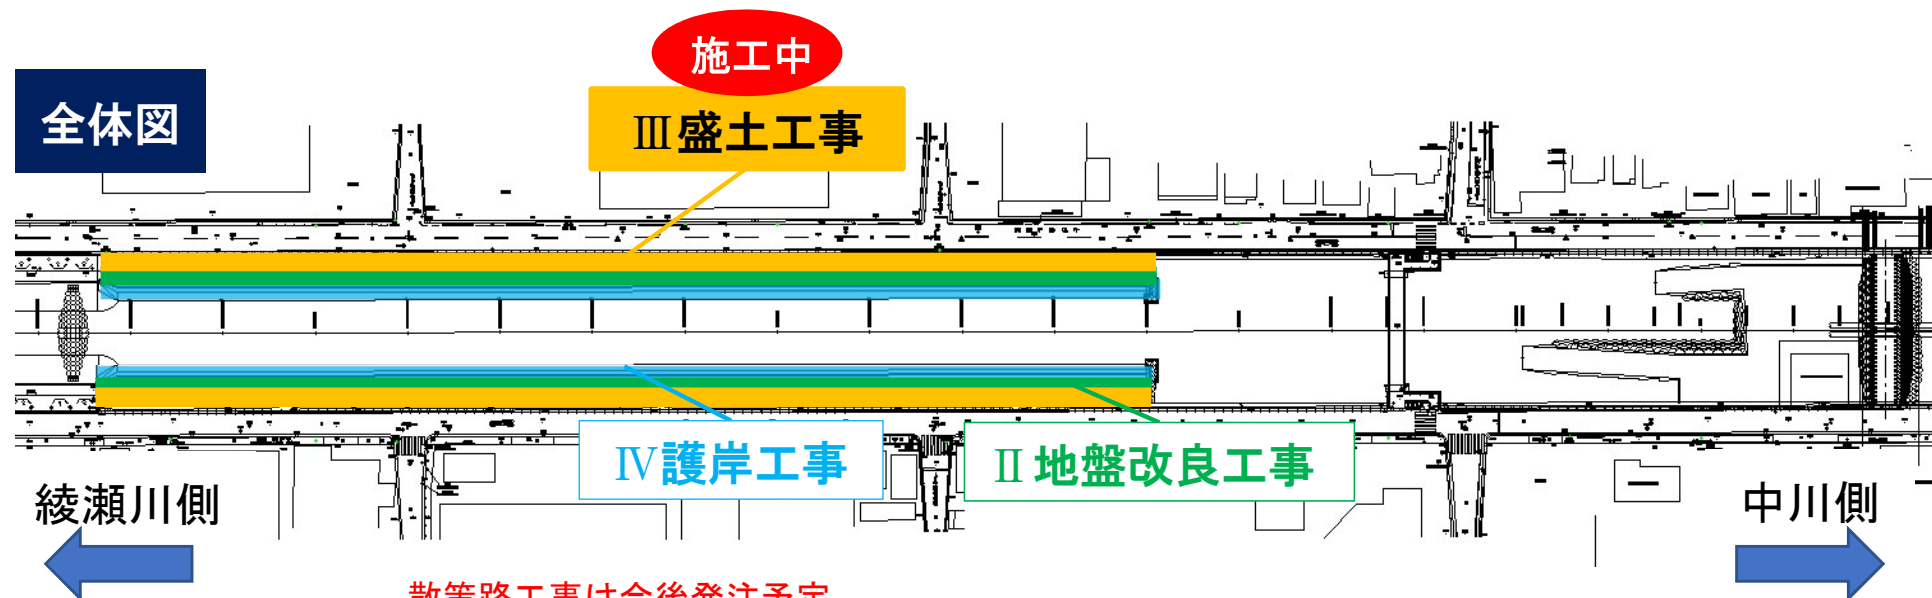

散策路工事は今後発注予定
(護岸工事が完了してから着手予定)

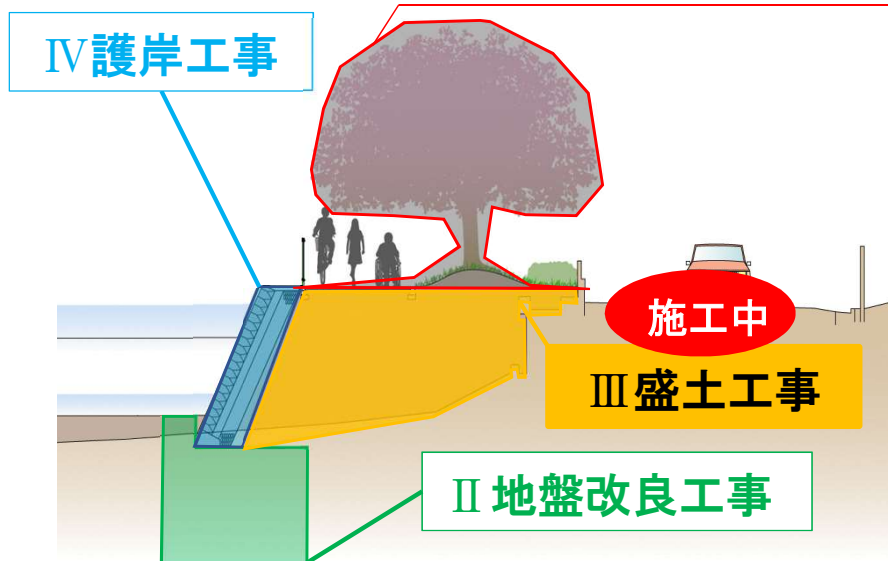

2-1 周辺環境への配慮について

車両のタイヤを洗浄する機械



タイヤを回しながら、水を噴射する。


- 土を運び入れた車両が道路に出る際に、タイヤの洗浄を行う。



• 周辺道路を汚しにくくなる。

3 その1工事のスケジュールについて

3-1 その1工事の今後のスケジュールについて

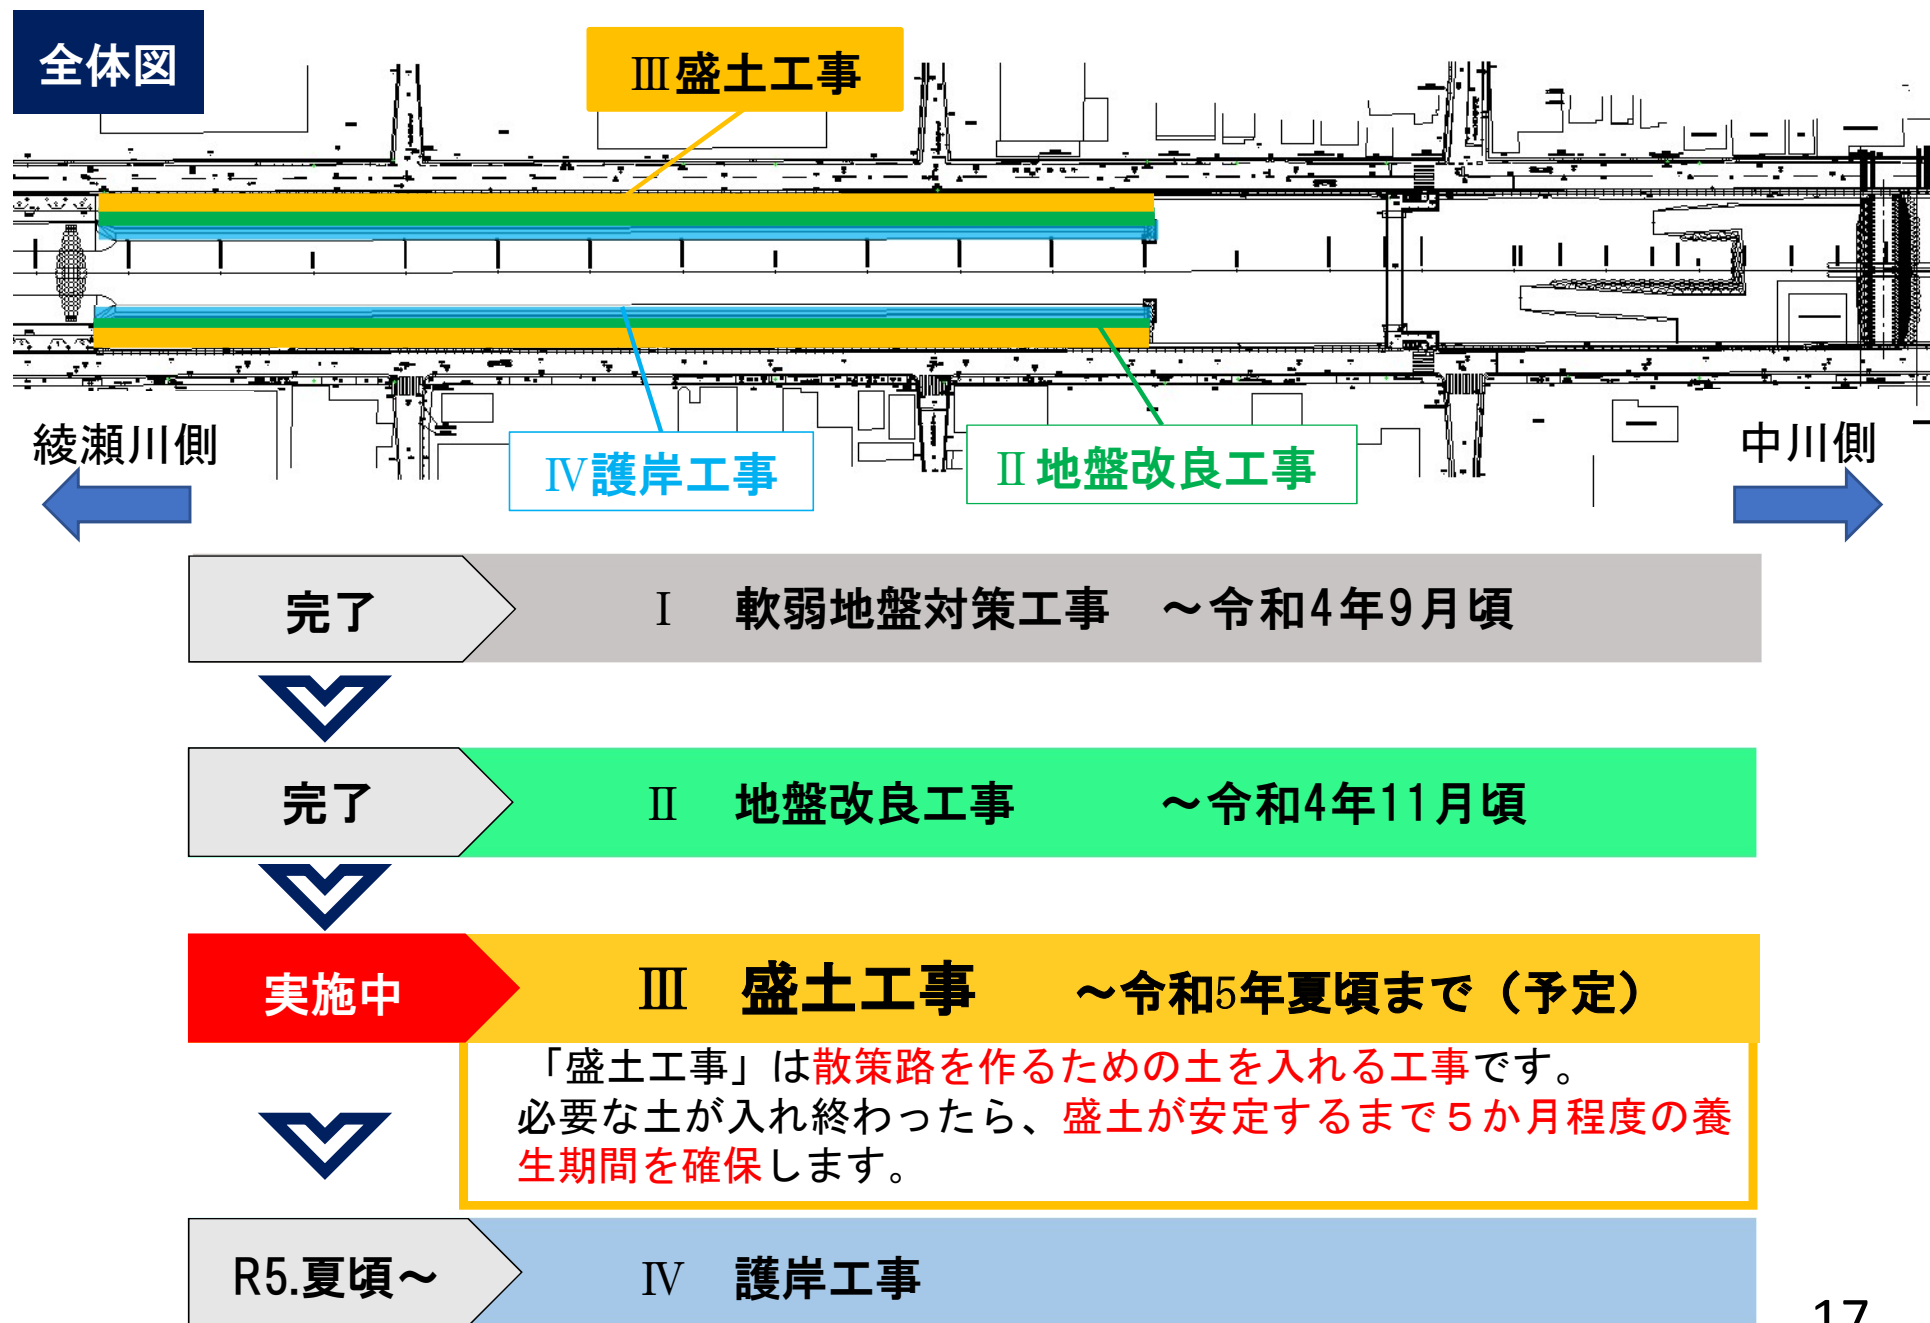

3-2 花畑川環境整備事業に関するご報告について


花畑川環境整備事業に関するご報告

第1号（令和4年12月）

花畑川工事の進捗について

工事期間を約1年延長させていただきます

足立区では、区民の皆様の安全安心を守り、かつ「憩いの場」「地域交流の場」となるよう花畑川の環境整備工事を「その1」から「その4」に分けて進めています。



現在「その1」工事（右記参照）を実施していますが、川底に約1m積もった泥土への対応が必要となったため、当初の予定から**大幅な工事費用の増額と約1年間の工事期間の延長**を行いました。

| | |
|-----------|------------------------------|
| これまでの工事期間 | 令和3年3月24日～令和5年11月20日 |
| 見直した工事期間 | 令和3年3月24日～ 令和6年10月31日 |

工事内容の大幅変更に伴う工事期間の延長により、花畑川環境整備事業の早期完成を心待ちにいただいている区民の皆様に、ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

全体の工事計画を見直しています

「その1」工事で大幅に工事費用が増加したため、当初想定していた全体事業費も、大幅に超過する見込みとなりました。このため、花畑川環境整備事業の全体計画の見直し・精査を行っています。

今後は年に2回ほど説明会、本掲示、回覧板などを用いて花畑川環境整備工事の最新情報について、区民の皆様へお伝えしてまいります。

ご不明点がございましたら、右上の連絡先までお問い合わせください。

連絡先

足立区 都市建設部 道路整備課 整備第二係

【電話】03-3880-5925 【FAX】03-3880-5620

【メール】kukaku@city.adachi.tokyo.jp

QR

花畑川環境整備「その1」工事スケジュール



4 関連団体のヒアリングについて

4 関連団体のヒアリングについて

花畑川周辺で活動中の関連団体


| NO. | 団体名 | 実施日 |
|-----|---------------|------------|
| 1 | 神明美化グループ | 令和4年11月24日 |
| 2 | NPO法人エコロジー夢企画 | 令和4年11月24日 |
| 3 | 足立パドラーズ | 令和4年11月24日 |
| 4 | 障がい者団体 | 調整中 |



意見の集約・調整を行っておりますので、
第3回花畑川を考える会でご報告をさせていただきます

5 今後の「考える会」の進め方について

5 今後の「考える会」の進め方について

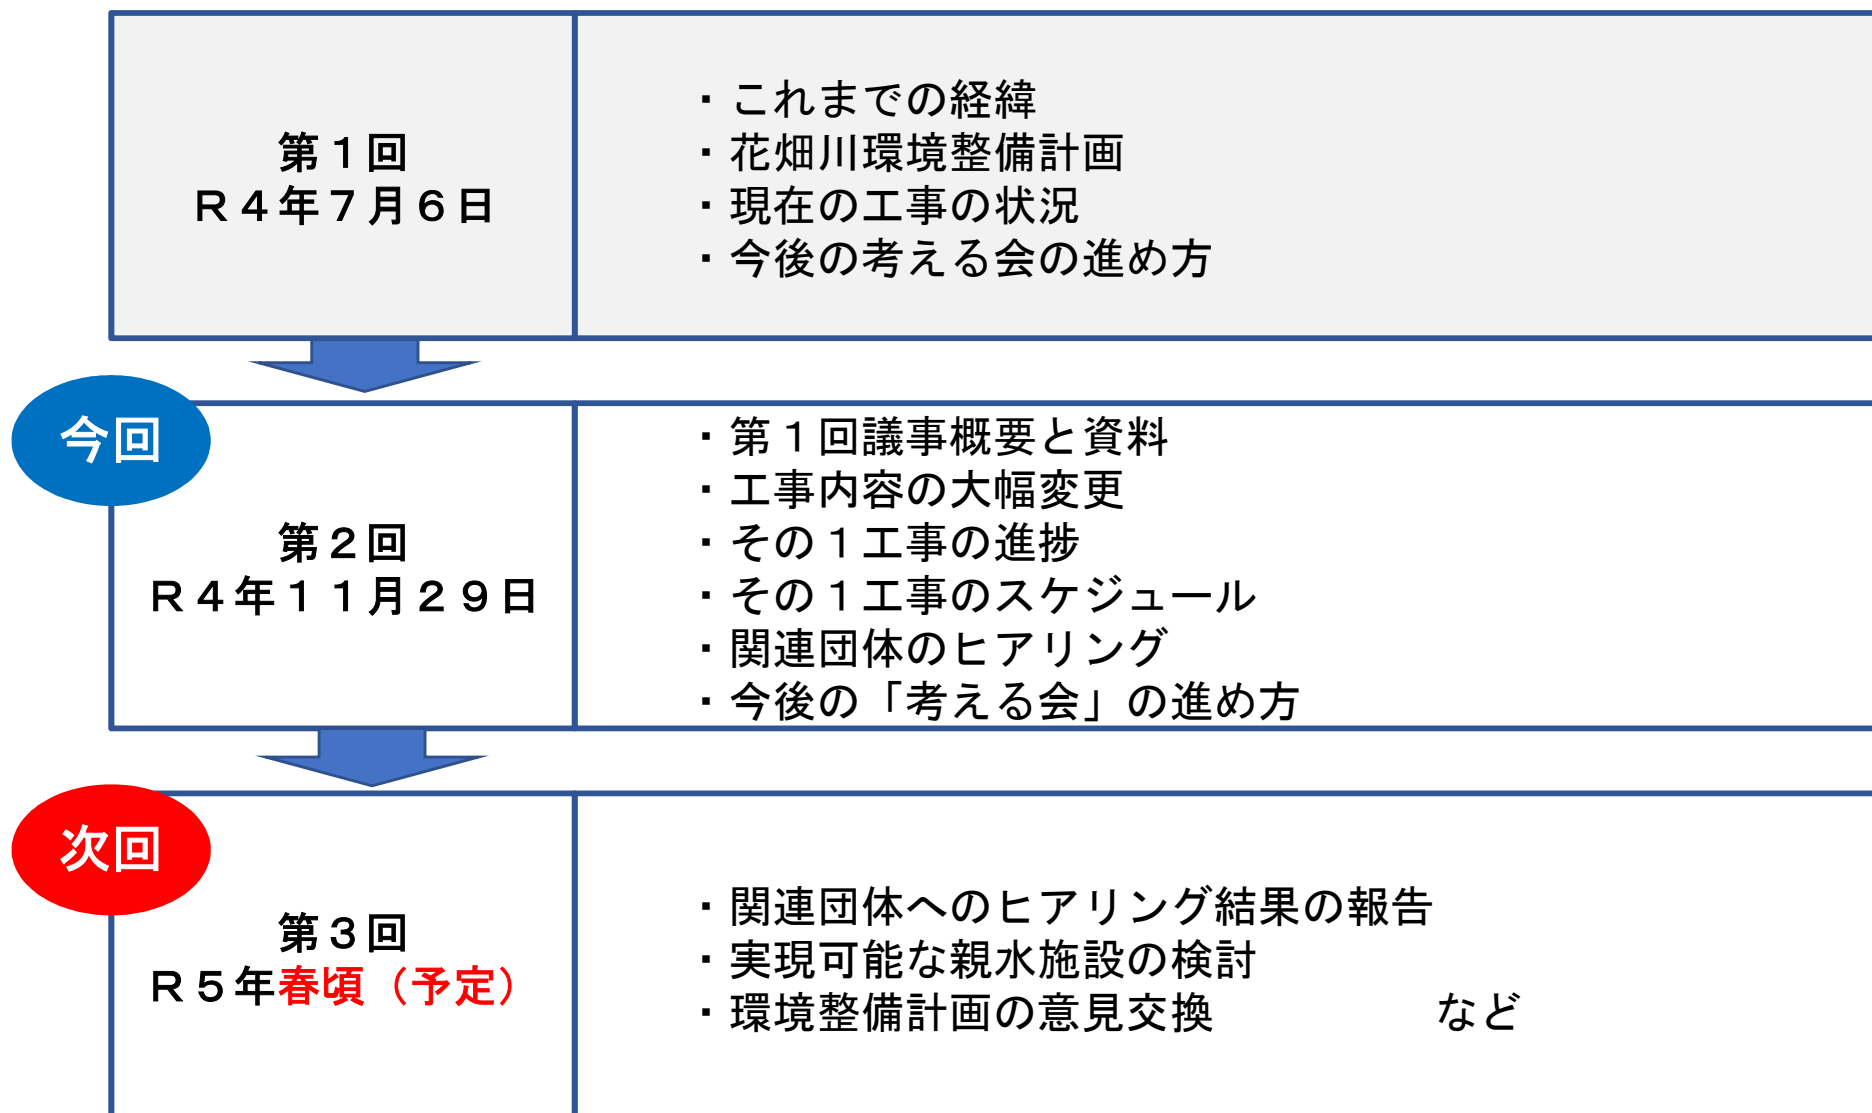

ご清聴ありがとうございました。
