

第10回 花畑川を考える会

令和8年1月27日
佐野地域学習センター

本日の議題

- 1 現在の工事状況について
- 2 第2段階の工事概要について

1 現在の工事状況について


1-1 工事の進捗について

1-2 富士見歩道橋架け替えに伴う迂回路について

1-3 桜寄附記念板について

1-1 工事の進捗について

【花畑川全体図】

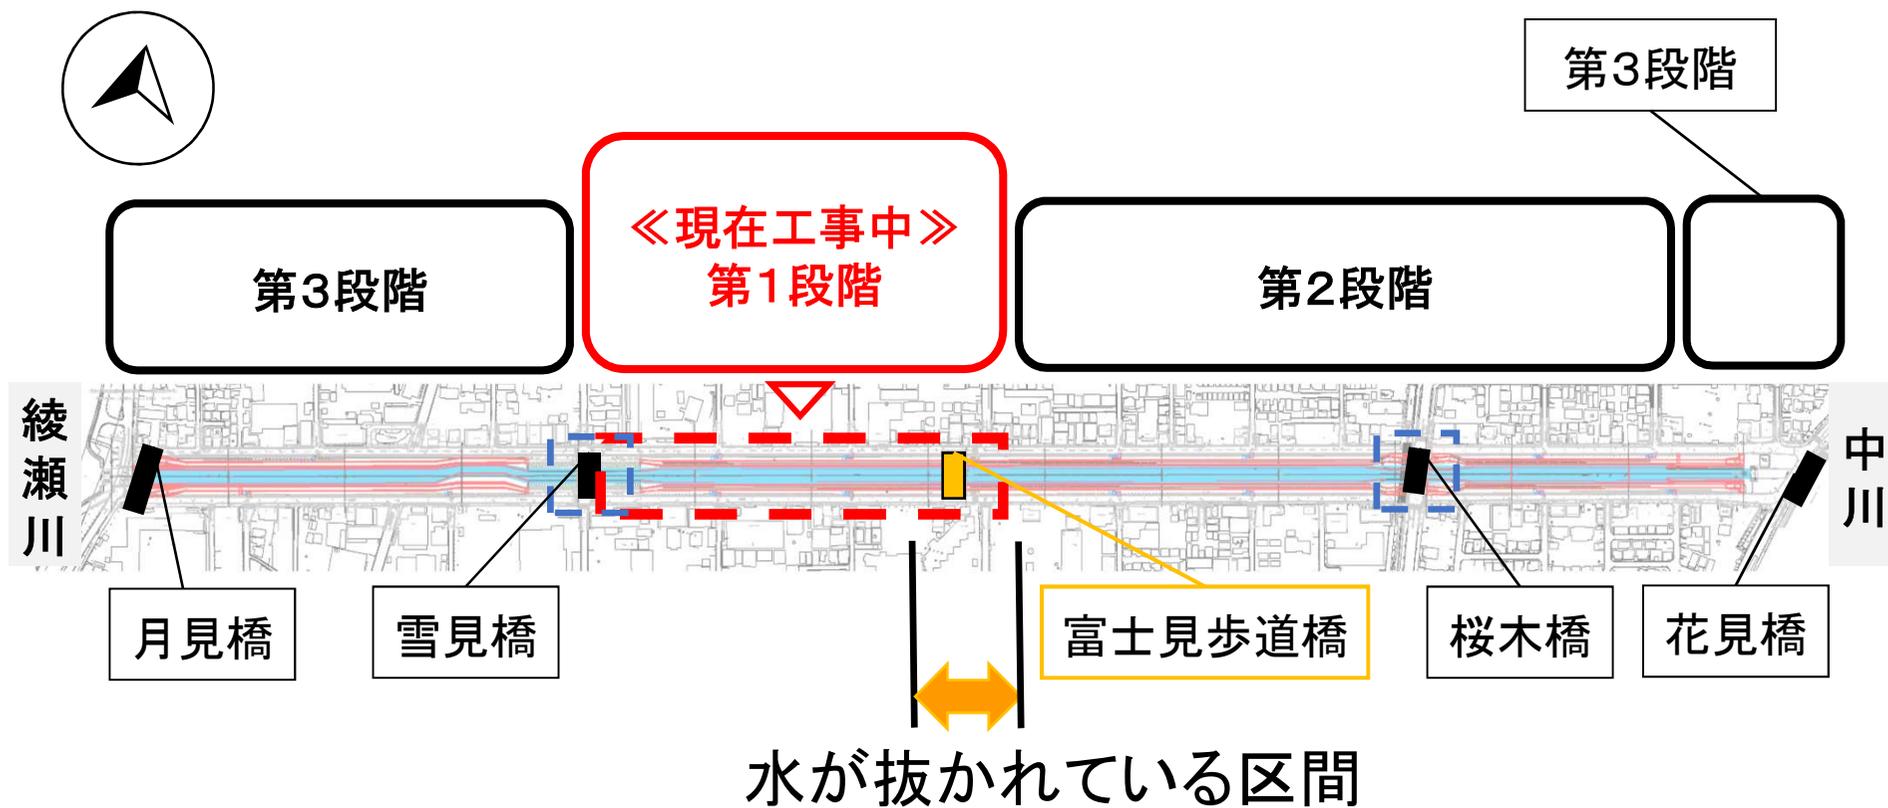

1-1 工事の進捗のついて

【通水工事の状況】



令和7年10月



現在

1-1 工事の進捗について

【通水工事の工事内容①】

ステップ① 河床土の搬出

R7.10月頃

設計した河床の高さにするために、**土を搬出**します。土は花畑川内に仮置きし、第二段階の工事で再利用する予定です。



ステップ② 仮締切の移設 迂回路の整備

R7.11月～R8.3月頃


仮締切の設置・撤去を行い、水が流れるようにします。
また、富士見歩道橋の架け替えに備え、**迂回路を整備**します。



ステップ③ 散策路の仕上げ

R8.春頃


桜の植樹、一部区間の**散策路の整備**をし、散策路の開通に向け、仕上げの作業を行います。**桜寄附記念板**も設置します。

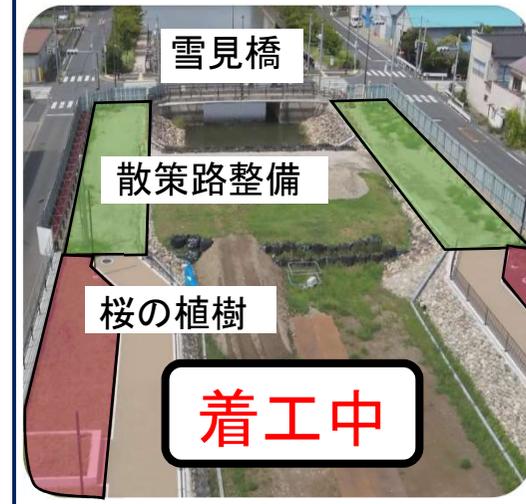

1-2 富士見歩道橋架け替えに伴う迂回路について

【ステップ② 富士見歩道橋架け替え工事に伴う迂回路について】

3月17日(火)富士見歩道橋が**通行不可**。移設した仮締切の上を迂回路として利用

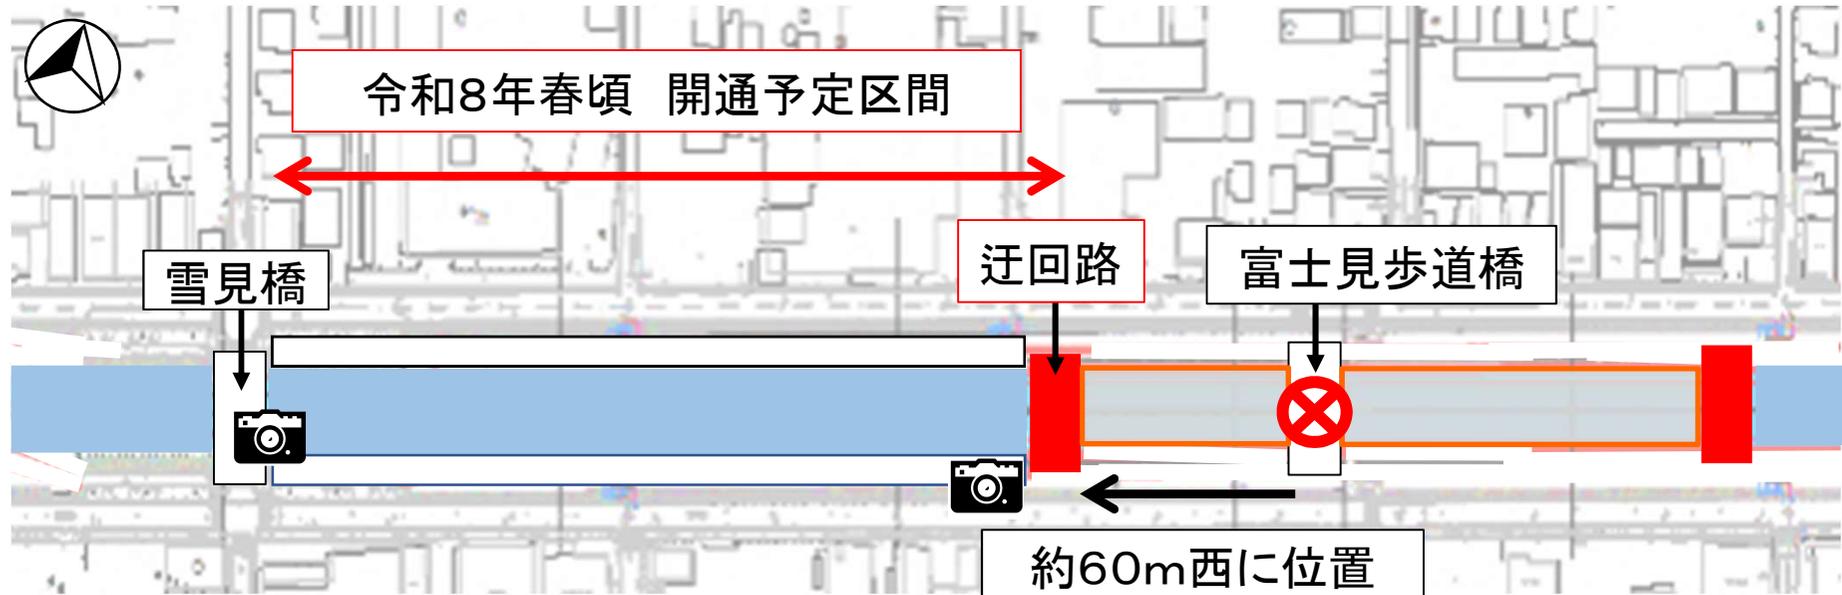

凡例

- : 迂回路・仮締切
- ⊗ : 通行止め
- 📷 : 防犯カメラ



1-3 桜寄附記念板について

【ステップ③】 桜寄附記念板の詳細について

令和8年2月

2か所に設置予定。

令和8年春頃 開通予定区間

雪見橋

記念板

富士見歩道橋

記念板

凡例

- : 仮締切
- : 桜寄附記念板



桜寄附記念板イメージ
毛長川・綾瀬川緑地

2 第2段階の工事概要について

2-1 第2段階の整備方針


2-2 第2段階のスケジュール

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

- ① 親水テラス
- ② デッキテラス
- ③ 階段護岸
- ④ 桜木橋のアンダーパス

2-1 第2段階の整備方針

第2段階概要図

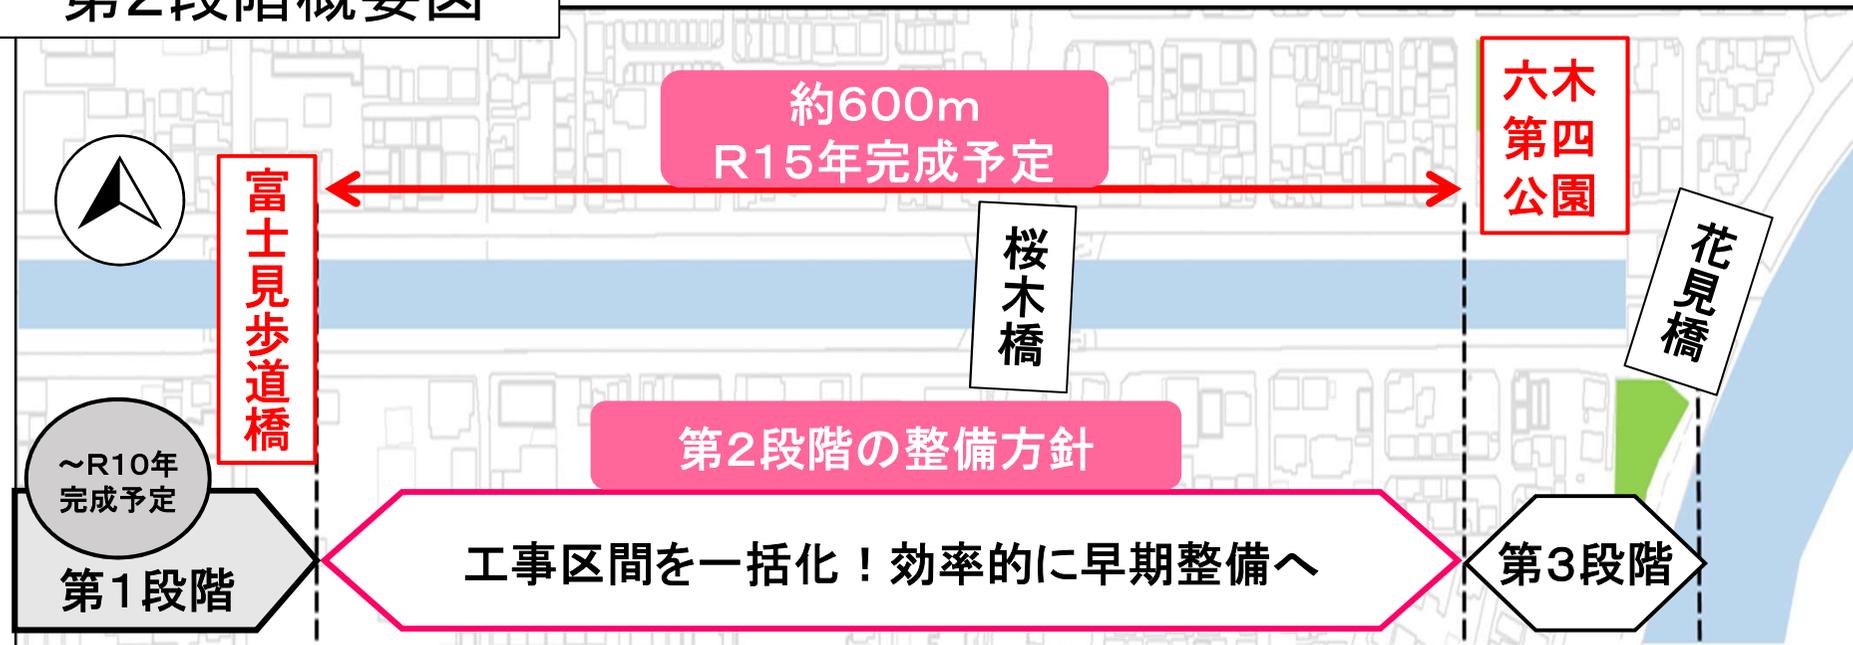

整備のポイント


- ① 富士見歩道橋～六木第四公園の区間※1を一括整備！
- ② 早期整備が可能となり、令和15年までの完成を目指す！
- ③ 第1段階よりもさらに多くの親水施設を整備！※2

※1 延長は約600mです。

※2 第1段階(雪見橋～富士見歩道橋)では親水施設として階段護岸を1か所整備します。

2-2 第2段階のスケジュール


【第2段階の今後の流れ】

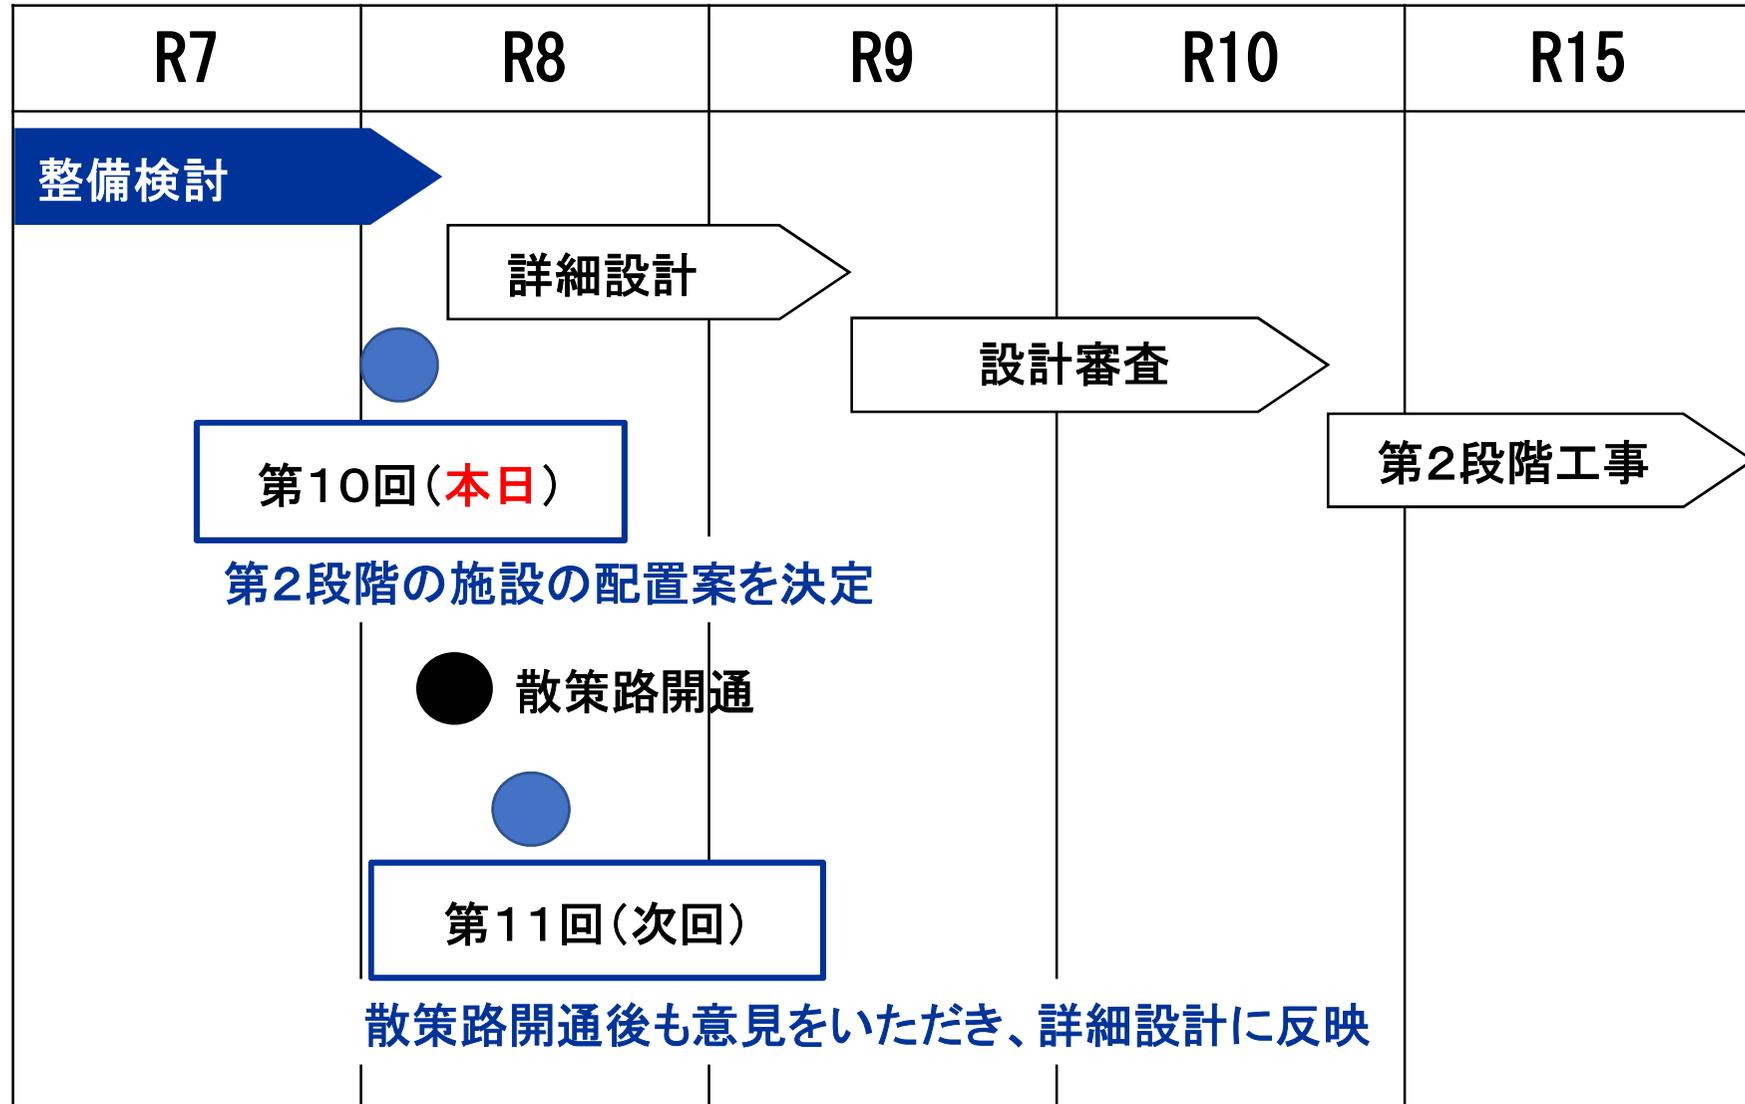

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【前回お示した第二段階の配置案について】

今回の考える会で意見をいただきたいところ: □

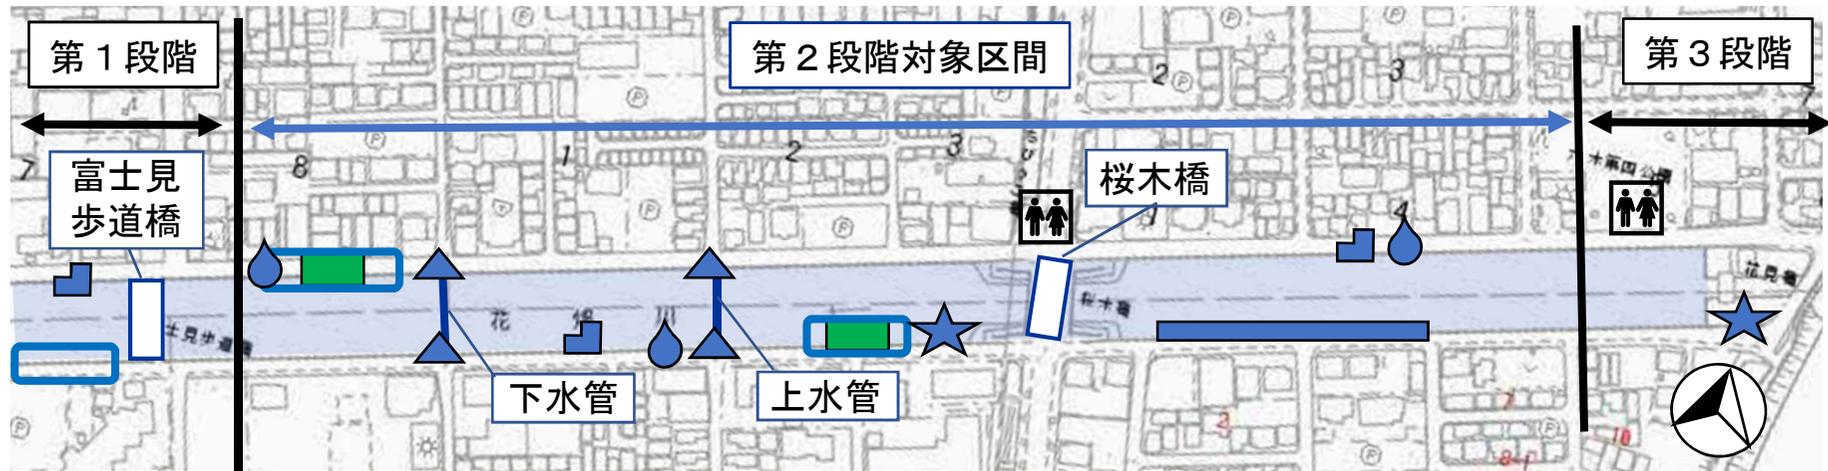

凡例

① 親水施設

① ■ : 親水テラス

② ▲ : デッキテラス

③ ■ : 階段護岸

② 休憩施設

■ : 藤棚、パーゴラ

③ 利便施設

★ : 歴史看板マップ 💧 : 水飲み手洗い場

□ : 緑地広場
キッチンカーの停車が可能なイベントができるスペース


🚻 : 手洗い及びトイレ
(整備せず、周辺トイレを周知)

その他

④ □ ・ 桜木橋 (アンダーパス) の形状
・ 防犯カメラ

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【① 親水テラス】

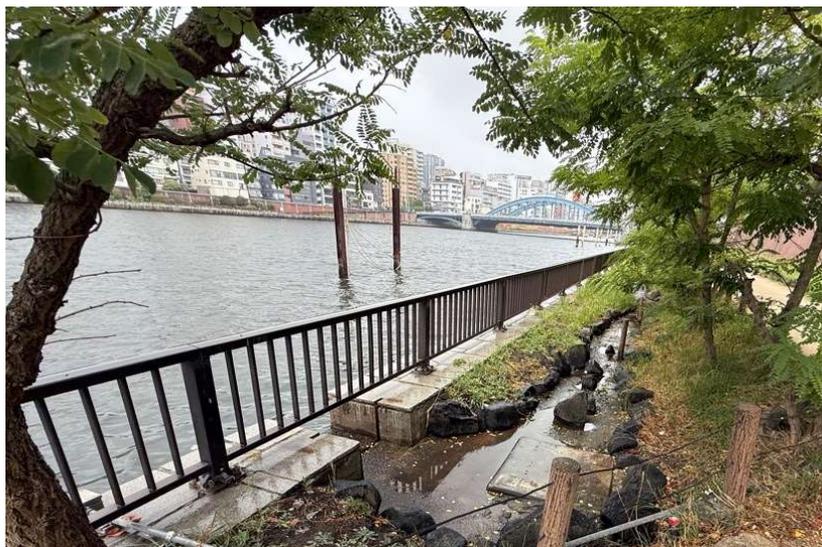

※ 他の自治体の整備事例の写真です。

前回の考える会での意見

良いものを作ってほしいとは思いますが、後々のメンテナンスや利活用のことも踏まえ、検討してほしい。

検討


- ・設置後の維持管理面
- ・運河らしさを残す（学識経験者）

結論

設置しない方針

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【② デッキテラス】

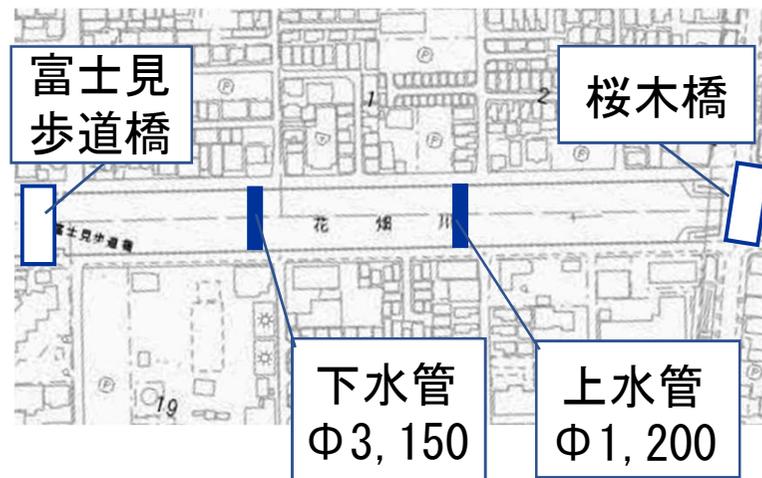

前回の考える会での意見

提案いただいた擬木のデッキテラスはとても良い

来年度

土質調査を実施

埋設管に影響がある

案 1

- ・ 護岸を切り開く
- ・ 4箇所設置

埋設管に影響がない


案 2

- ・ 護岸を切り開かない
- ・ 2箇所設置

※ 他の自治体の整備事例の写真です。

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について


② デッキテラス案-1 (土質調査で埋設管に工事の影響がある場合)

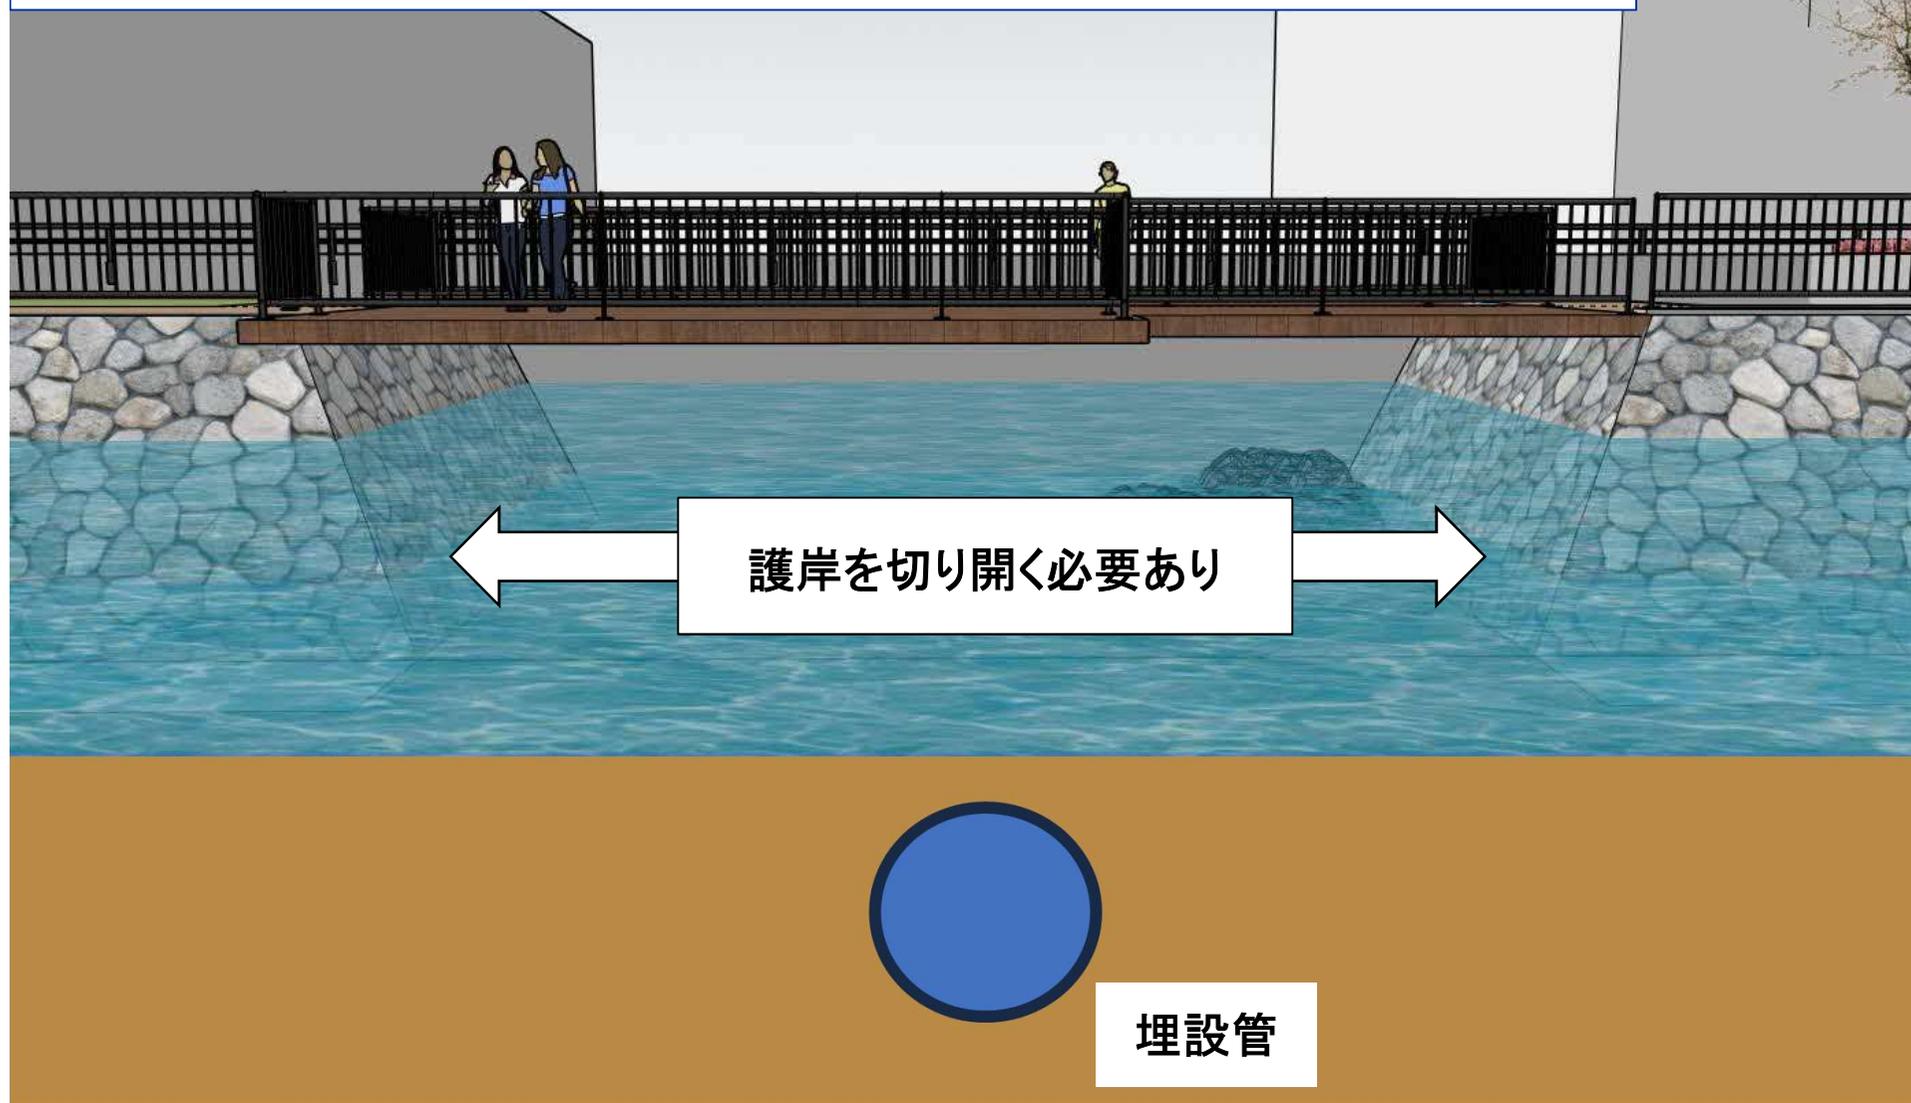

画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について


② デッキテラス案-1 (土質調査で埋設管に工事の影響がある場合)

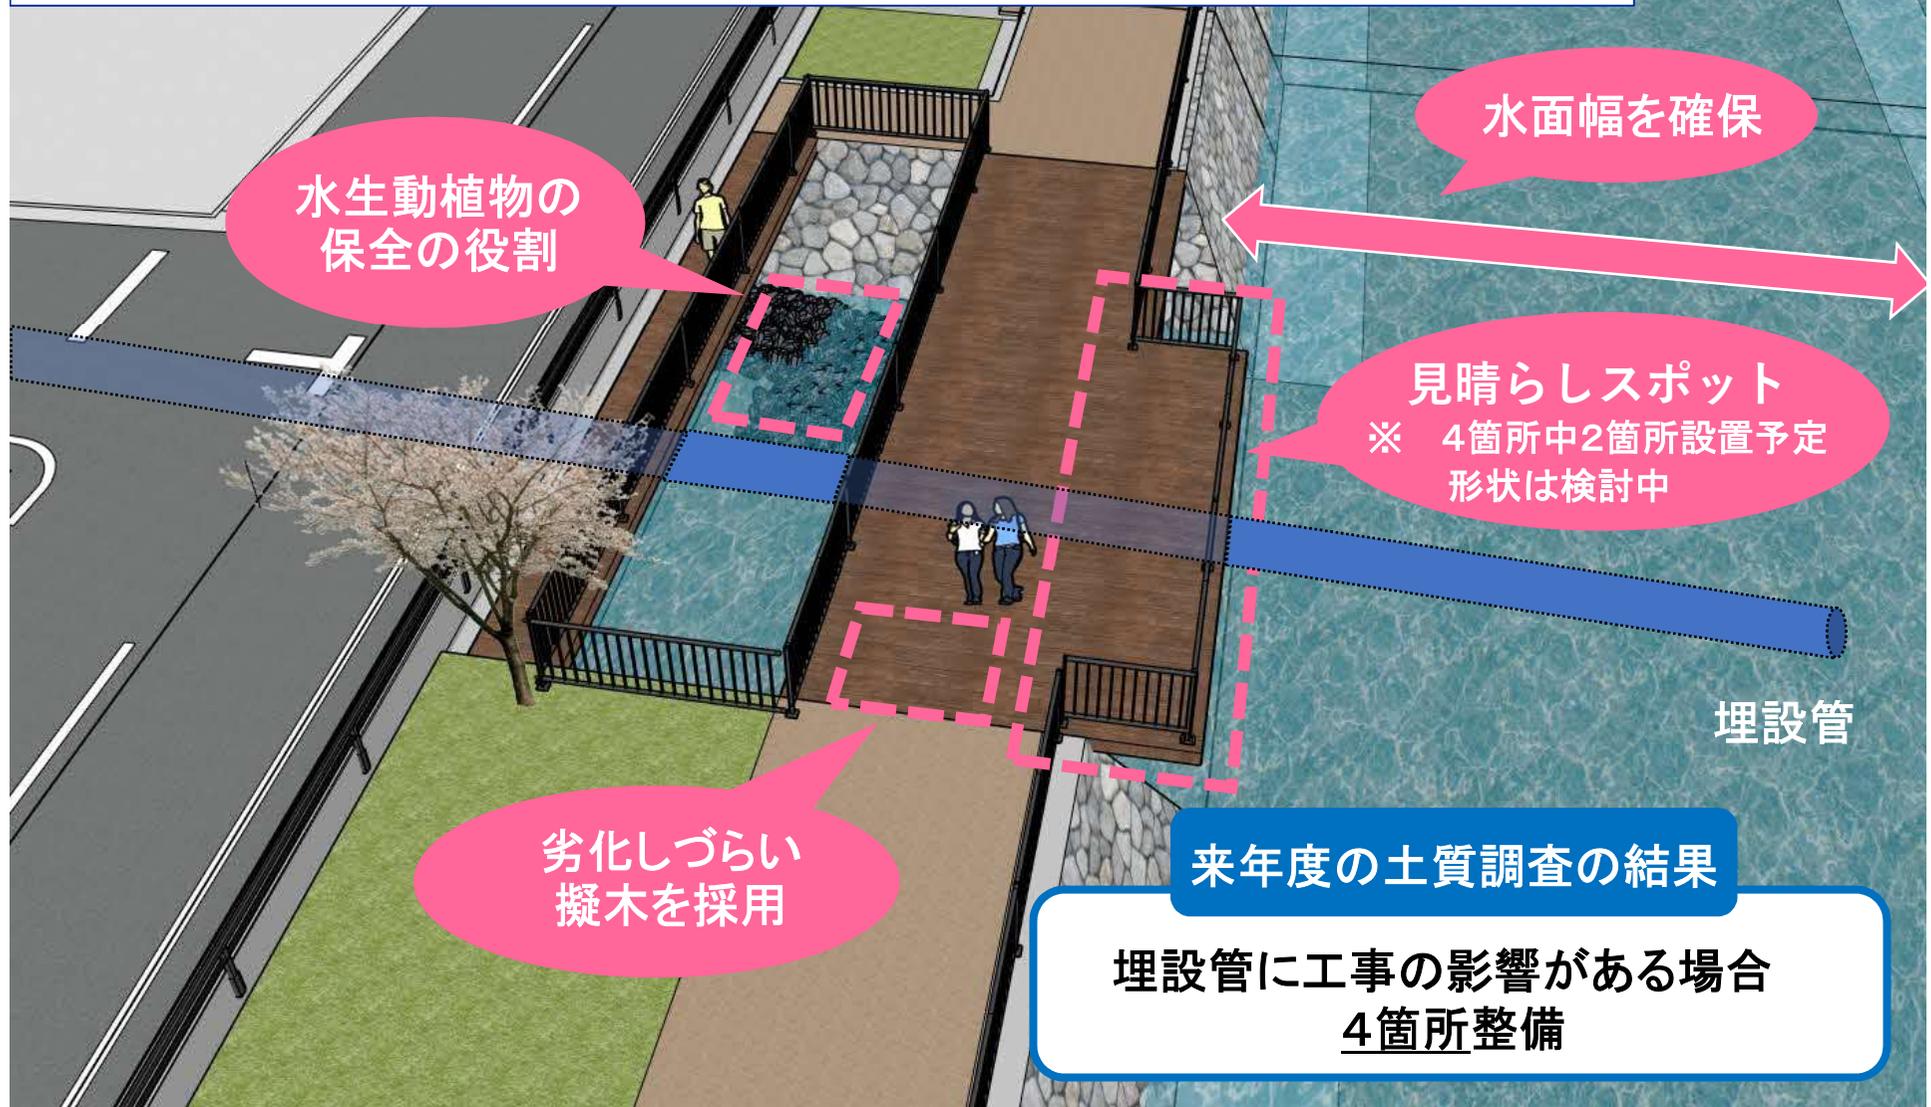

画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

② デッキテラス案-2(土質調査で埋設管に工事の影響がない場合)

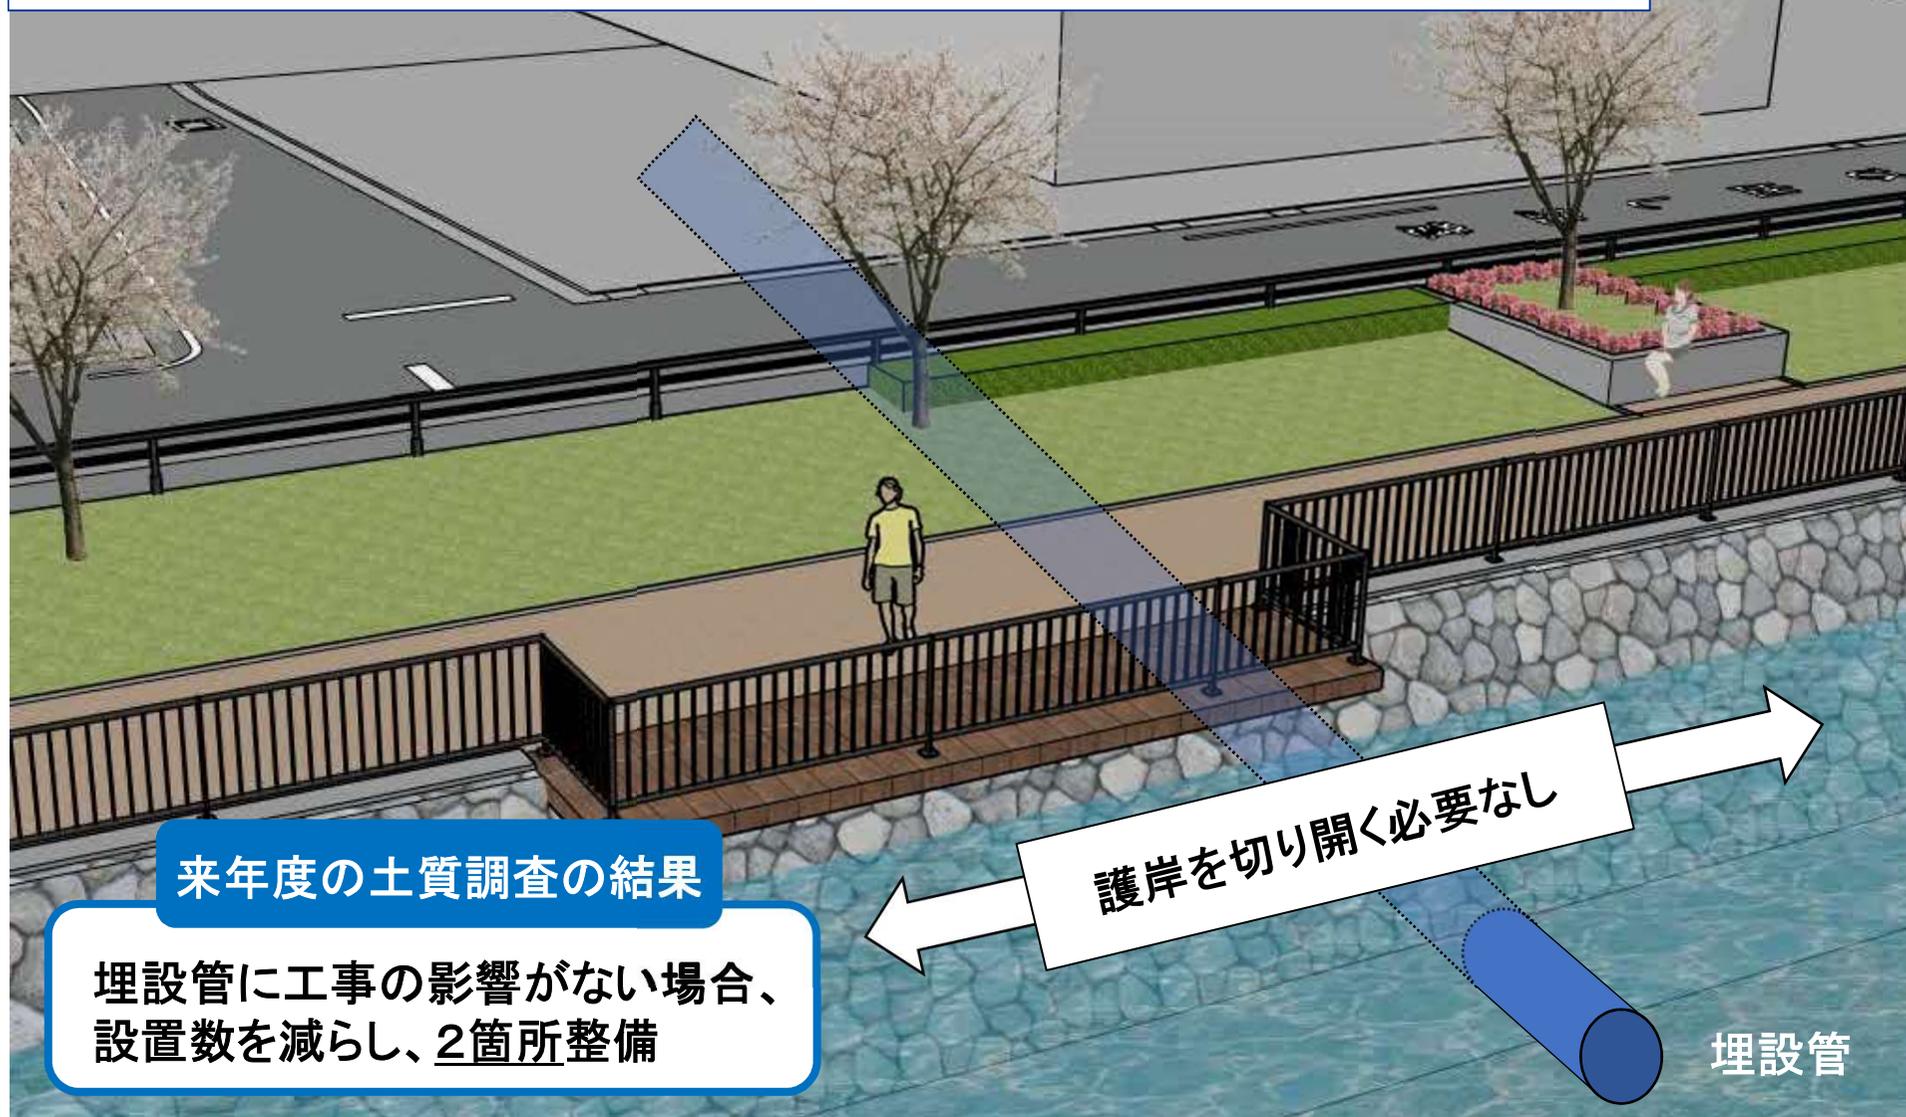

来年度の土質調査の結果

埋設管に工事の影響がない場合、
設置数を減らし、2箇所整備


護岸を切り開く必要なし

埋設管

画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【③ 階段護岸】

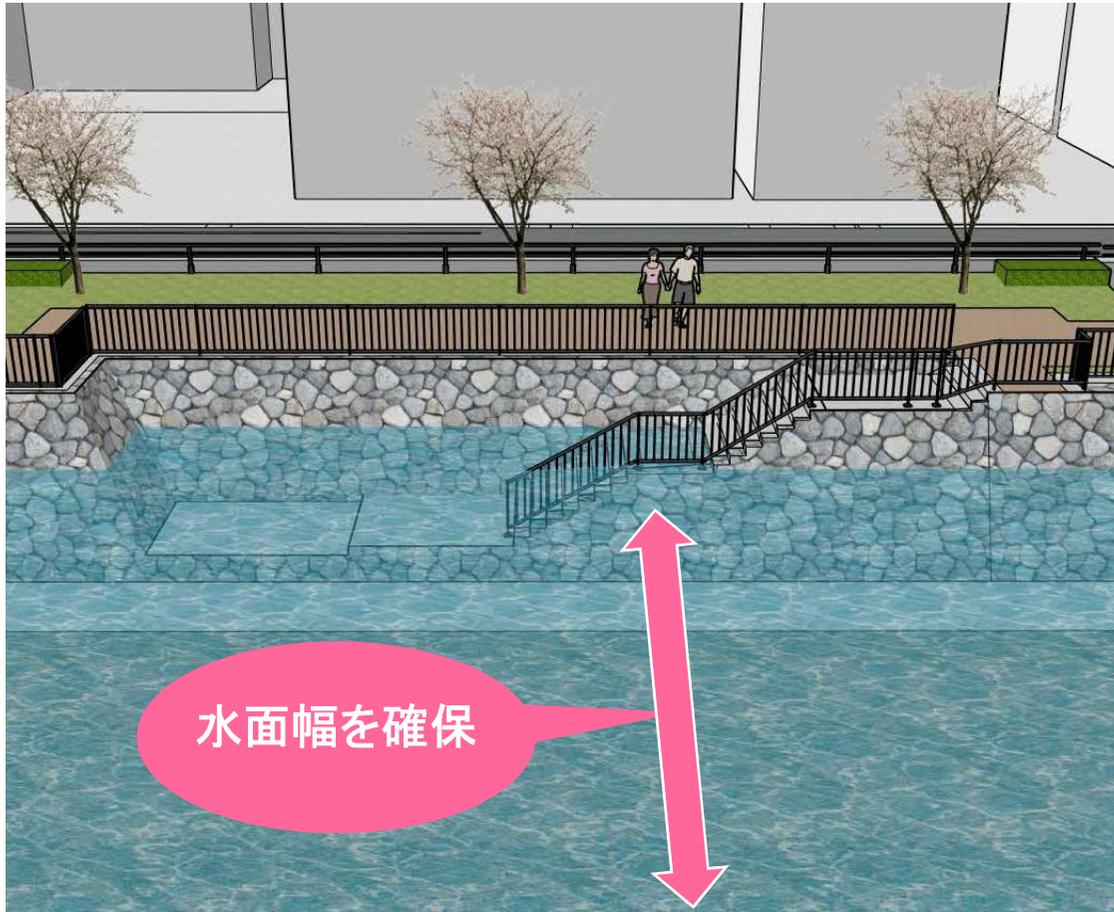

画像はイメージです。
完成後と色調等が異なる場合があります。

今までの考える会での意見

・水面幅を確保してほしい。

検討

直線的な運河の景観を残した方が良い(学識経験者の意見)

今後

景観と機能を両立したものを検討

2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【④ 桜木橋のアンダーパス】



平成17年

防犯上の理由により封鎖

前回の考える会での意見

雪見橋のように散策路を分断した構造にしないでほしい

今後

第2段階完成時に明るさなどの防犯対策の検討をし、橋の下を通行する方針。


2-3 これまでの意見を踏まえた配置案について

【第2段階の配置案について】 土質調査で埋設管に工事の影響がある場合

第1段階対象区間
(整備済約350m)

第2段階対象区間
(約600m)

第3段階対象区間

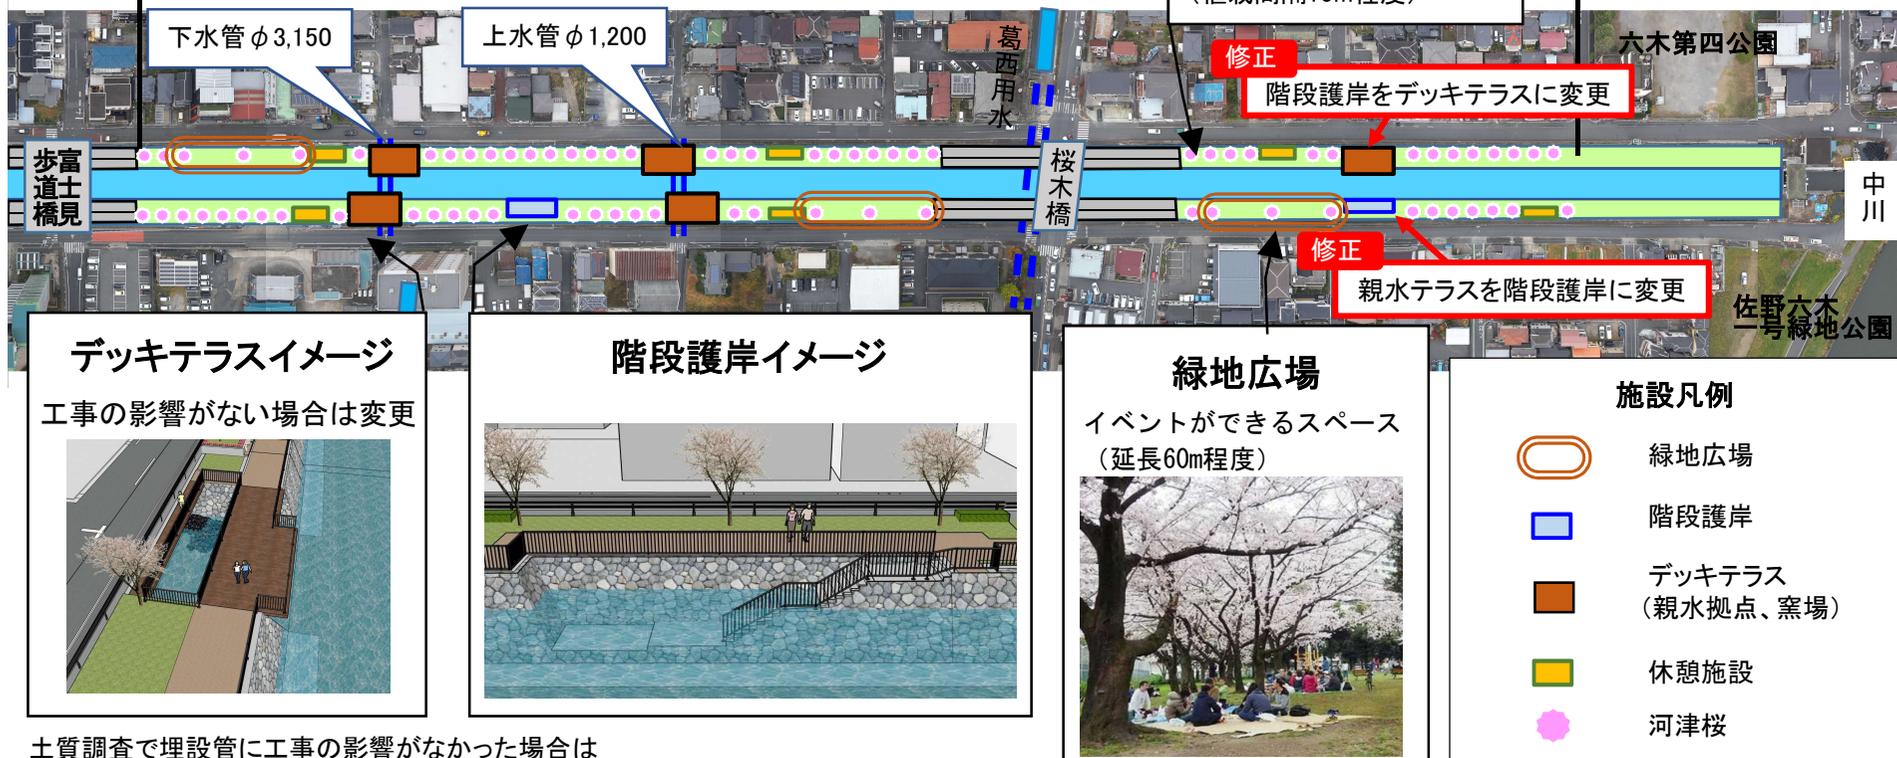

土質調査で埋設管に工事の影響がなかった場合は
デッキテラスの設置箇所を減らします。

手洗い水飲み場、歴史看板マップの設置箇所数、休憩施設の設えは検討中です。

画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

ご清聴ありがとうございました。

次回予定

第11回
令和8年6月頃

第1段階散策路の開通を経て
